

PROJEKTPLAN FÖR "BIBLIOTEK VÄRMLAND – MED LÅNTAGAREN I CENTRUM", 2003 - 2004

BAKGRUND OCH SYFTE:

Utdrag ur projektansökan:

"Minskade resurser och ökat tryck på biblioteken

Biblioteken i Värmland har många gånger de senaste åren talat om ökad samverkan. I nuläget finns en samverkan mellan kommunbiblioteken, länsbiblioteket och universitetsbiblioteket beträffande kompetensutveckling och lån av böcker emellan biblioteken.

Idag upplever varje kommunbibliotek att det blir allt svårare att hinna med alla uppgifter som ställs. Media- och personalanslag har krympt i många kommuner och man upplever problem att bemanna diskarna, hinna svara i telefon och andra löpande uppgifter. Öppettiderna minskar och de nya böckerna blir allt sällsyntare. IT-tekniken har förändrat mycket på biblioteken och de små kommunerna har på ett helt annat sätt en teoretisk möjlighet att ge avancerad informationsservice. Antalet studerande har ökat kraftigt liksom de, som studerar på distans vid något universitet eller högskola. Alla studerande är stora användare av bibliotek. Skolans arbetssätt har förändrats så att eleverna mer ska söka fram svaret själva (problembaserad inläring).

Allt detta gör att biblioteken har fått utökade uppgifter och trycket på biblioteket har ökat, men resurserna har minskat. Kan biblioteken behålla kvaliteten genom att samverka över kommungränserna i ett "Bibliotek Värmland"? Detta vill vi utreda och arbeta för att förverkliga under två och ett halvt år. Vi vill finna praktiska lösningar som främjar samarbetet. Formella och informella hinder ska undanröjas. Vi tror att det är möjligt att tillhandahålla ett bredare bokurval, fler exemplar av talböcker, bättre datakataloger, fler databaser och bättre utnyttjad specialistkompetens genom att arbeta i ett formaliserat nätverk av bibliotek. Genom samverkan kan vi uppnå synergieffekter och bättre resursutnyttjande. Målet är att skapa ett "Bibliotek Värmland" med gemensamma värderingar, och med högsta möjliga kompetens och samordning av resurserna för användarnas bästa.

Länsbiblioteket i Värmland har i samverkan med länets samtliga kommunbibliotek, Universitetsbiblioteket i Karlstad, Sjukhusbiblioteket och AV-centralen ansökt om och beviljats statliga medel för att anställa en projektledare för att genomföra "Bibliotek Värmland". Det är ett projekt där biblioteken genom ökad samverkan ska kunna tillhandahålla ett större utbud av boktitlar, tillgång till fler databaser och ökad tillgång till specialistkompetens".

MÅLSÄTTNING:


Övergripande mål: Ökad kvalitet på biblioteksservicen i Värmland genom skapandet av ett "Bibliotek Värmland" med gemensamma värderingar och med högsta möjliga kompetens och samordning av resurserna för användarnas bästa.

Projektmål: Gemensamma bokinköp Gemensam produktion av talböcker Gemensam datakatalog Gemensamma nyhetslistor Samverkan om databaser och andra elektroniska resurser Gemensam ingång till de elektroniska resurserna Gemensam bibliotekariekompetens Gemensamt lånekort

PRIORITERADE ARBETSOMRÅDEN 2003 – 2004:

Mediafrågor Samverkan om databaser och andra resurser Gemensam ingång till de elektroniska resurserna Gemensamt lånekort För varje arbetsgrupp kommer åtgärdsplaner att upprättas.

PROJEKTORGANISATION:

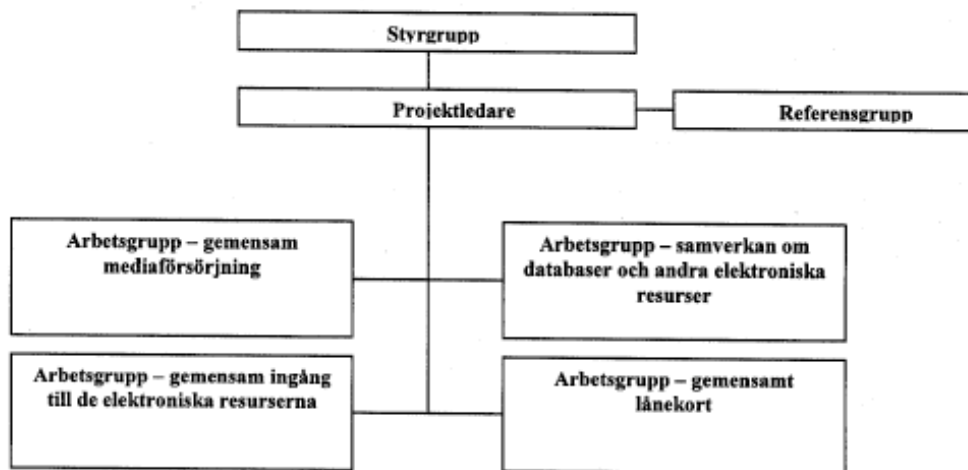

Styrgruppens roll: Att ta beslut om mål och ramar samt eventuella ändringar av dessa Att ta beslut om övergripande planer för projektet Att ta beslut om komplicerade samarbetsfrågor Att vara stöd för projektledaren

Projektledarens roll: Att svara för att projektet når målen Att utarbeta projektplan tillsammans med projektdeltagarna Att sammankalla styrgrupp, referensgrupp och arbetsgrupper Att följa upp och stämma av planer Att ha kontinuerlig översikt över projektet Att informera om projektet Att skriva lägesrapporter och slutrapport Att avrapportera till styrgrupp

Referensgruppens roll: Att vara stöd för projektarbetet Att fungera som rådgivare och bollplank Att förankra projektet och informera om det i sin kommun

Arbetsgruppernas roll: Att komma med förslag till samarbetslösningar

Bibliotekens roll: Deltagarna i arbetsgrupperna utses bland länets biblioteksanställda och bibliotekens insats blir arbetstid och kostnader för resor till arbetsgruppsmöten.

Om det uppkommer förslag på samarbetslösningar som kräver extra kostnader kommer frågan att lämnas över till bibliotekscheferna.

Länsbibliotekets roll: Länsbiblioteket skall vara representanter i alla arbetsgrupper eftersom arbetet med Bibliotek Värmland skall vara prioriterat under projekttiden.

EKONOMI:

Inom projektet finns inga ytterligare pengar utöver anställningen av projektledare.

ÅTGÄRDS- OCH TIDPLAN:

Aktivitet	Startdatum	Slutfört
Bibliotekschefsmöte	Juni 03	
Etablera projektorganisation	Juni 03	
Utarbeta projektplan	Juni 03	Sept 03
Besöka kommun-, universitets- och sjukhusbibliotek samt AV-central	Juni 03	Sept 03
Bibliotekschefsmöte med Östfold	Aug 03	
Starta arbetet i styrgrupp och arbetsgrupper	Sept 03	Nov 04
Utarbeta åtgärdsplaner för arbetsgrupperna	Sept 03	Nov 03
Avspark	Okt 03	
Genomföra åtgärdsplaner	Nov 03	April 04
Justera alt. utarbeta och genomföra nya åtgärdsplaner	April 04	Nov 04
Justera projektplanen		Dec 04
Lägesrapport till Region Värmland		Okt 03, April 04, Nov 04

/Ingalill Walander Olsson

